

COMISSÃO DA CEDEAO	
ECOWAS COMMISSION	COMMISSION DE LA CEDEAO
	
Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau	Department of Agriculture, Environment and Water Resources
ARAA / RAAF	
Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation	Regional Agency for Agriculture and Food

Atelier régional de formation en formulation de projet d'investissement agricole en liens avec les changements:

Gestion de Cycle de projets de l'ARAA

Abidjan, Hotel Koreit, Lundi, 22 février 2016

HITIMANA Léonidas, FAO-ARAA/CEDEAO

GUISSOU Sibraogo Richard, Expert Planification Stratégique et GCPA, ARAA/CEDEAO



Plan

- 1) Pourquoi la gestion du cycle des projets?
- 2) La gestion du Cycle des projets
- 3) Les principes clés du GCP
- 4) Les phases du Cycle des projets de l'ARAA

Pourquoi la gestion du cycle des projets

La GCP est une approche intégrée :

❖... l'Approche intégrée ? Une méthode qui...


- Assure que les projets sont ajustés pendant les (n=5) phases (selon les institutions) afin de devenir plus efficaces, efficaces et viables
- Spécifie les documents types à produire dans chaque phase afin de prendre des décisions
- Utilise un ensemble de documents avec un format de base unique / Standardisé.
- Permet une suivi harmonisé de tous les projets

Pourquoi la gestion des cycles des projets


La GCP propose des procédures pour s'assurer que :

- ◆ **Les projets soient pertinents** par rapport aux besoins réels des bénéficiaires; ceci implique que :
 - Les bénéficiaires soient impliqués, dès le départ, de manière active dans le processus de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation
 - Les objectifs soient clairement formulés.
- ◆ **Les projets soient faisables** :
 - Les résultats et objectifs soient réalistes et réalisables
 - Le suivi mette l'accent sur les aspects clés et aide à ajuster la mise en œuvre
 - Les résultats de l'évaluation soient utilisés pour tirer des leçons et reconcevoir les projets (futures)

Le Cycle de Project de l'ARAA

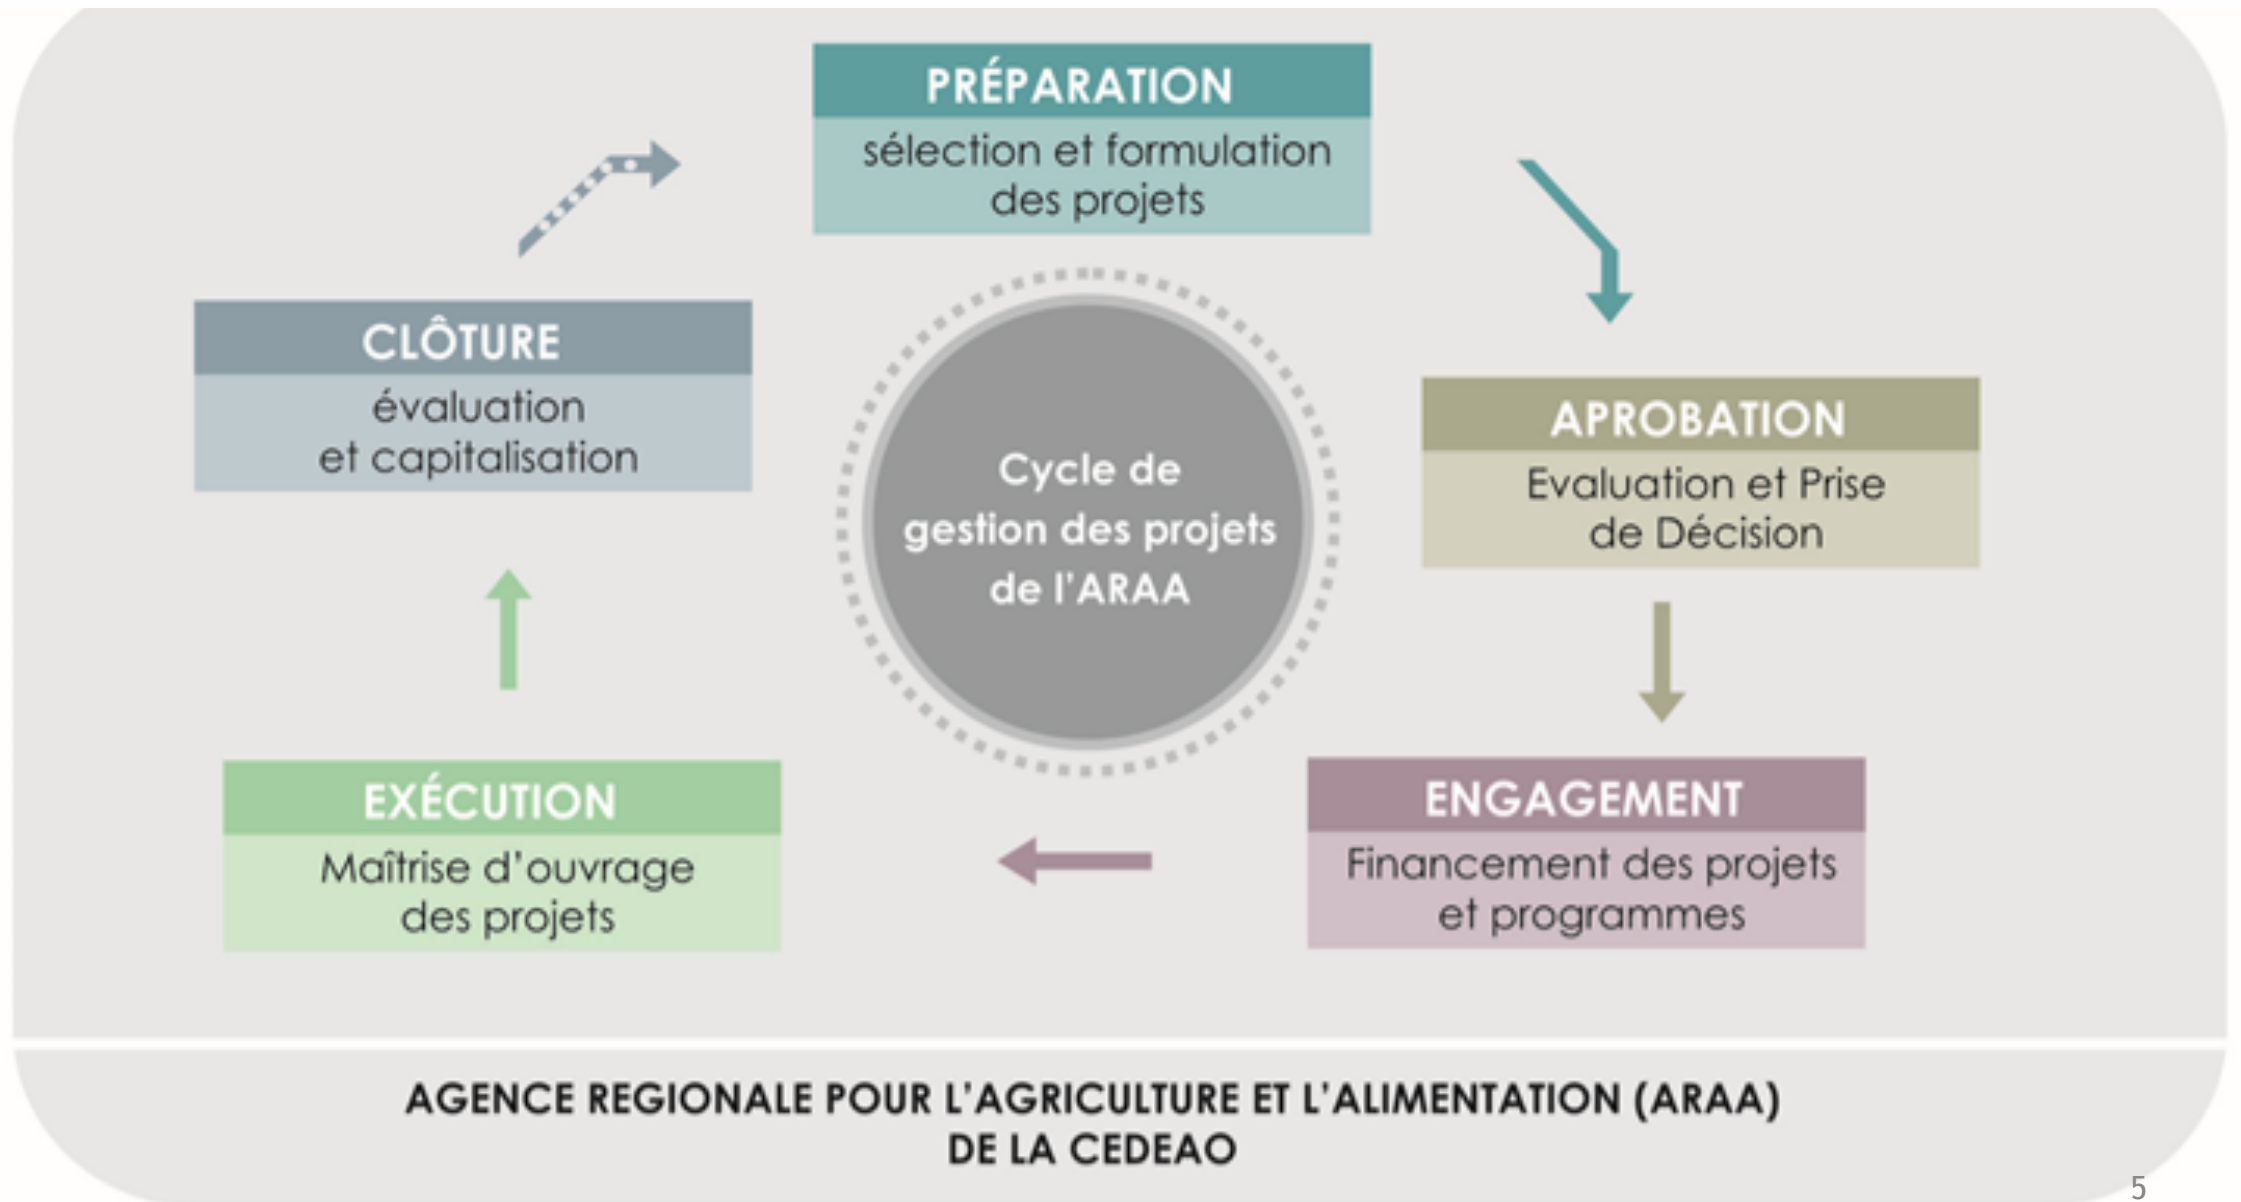

Le Cycle de Project de l'ARAA

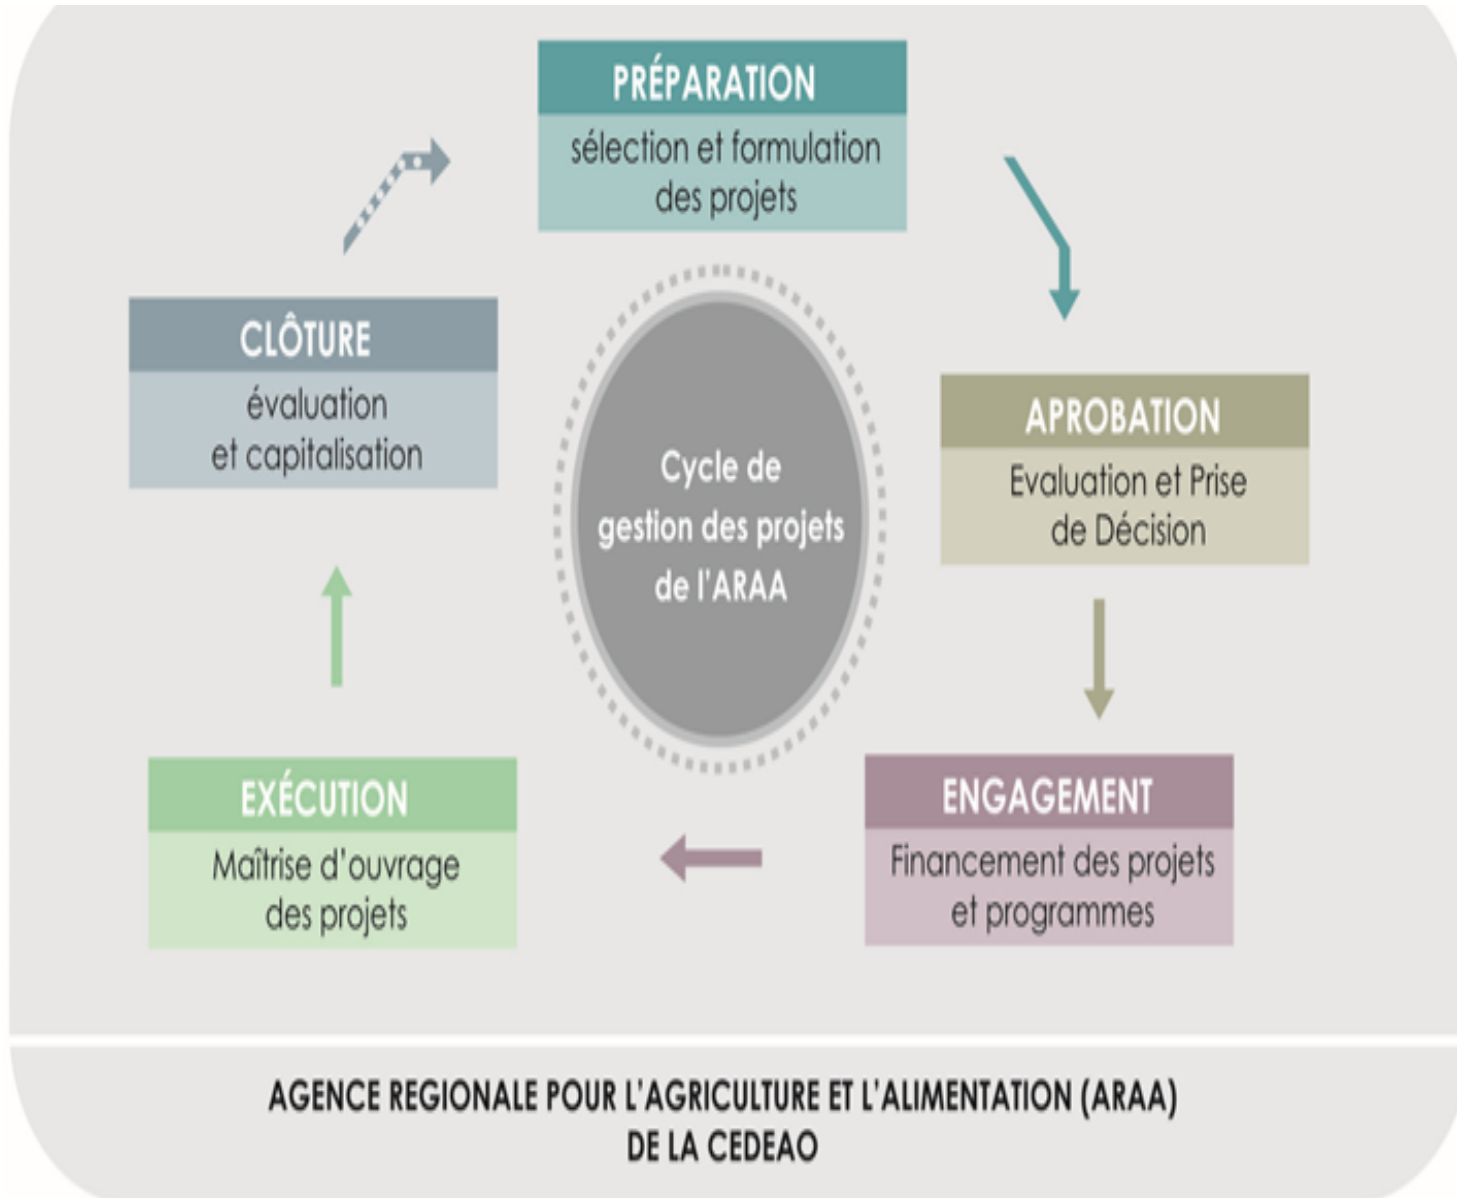

1. Préparation (Identification):


Permet d'identifier, de concevoir, de formuler de projets :

idées de projet, la justification et la manière de conduire la formulation

- Analyse des idées de projet à soumettre à des études approfondies (=pré faisabilité)
- Conduite de l'étude de faisabilité Prendre en compte les critères d'appréciation des projets (souvent les lignes directrices précisent les critères de notation)

L'ARAA peut faire appel à de personnes ressources

Le Cycle de Project de l'ARAA

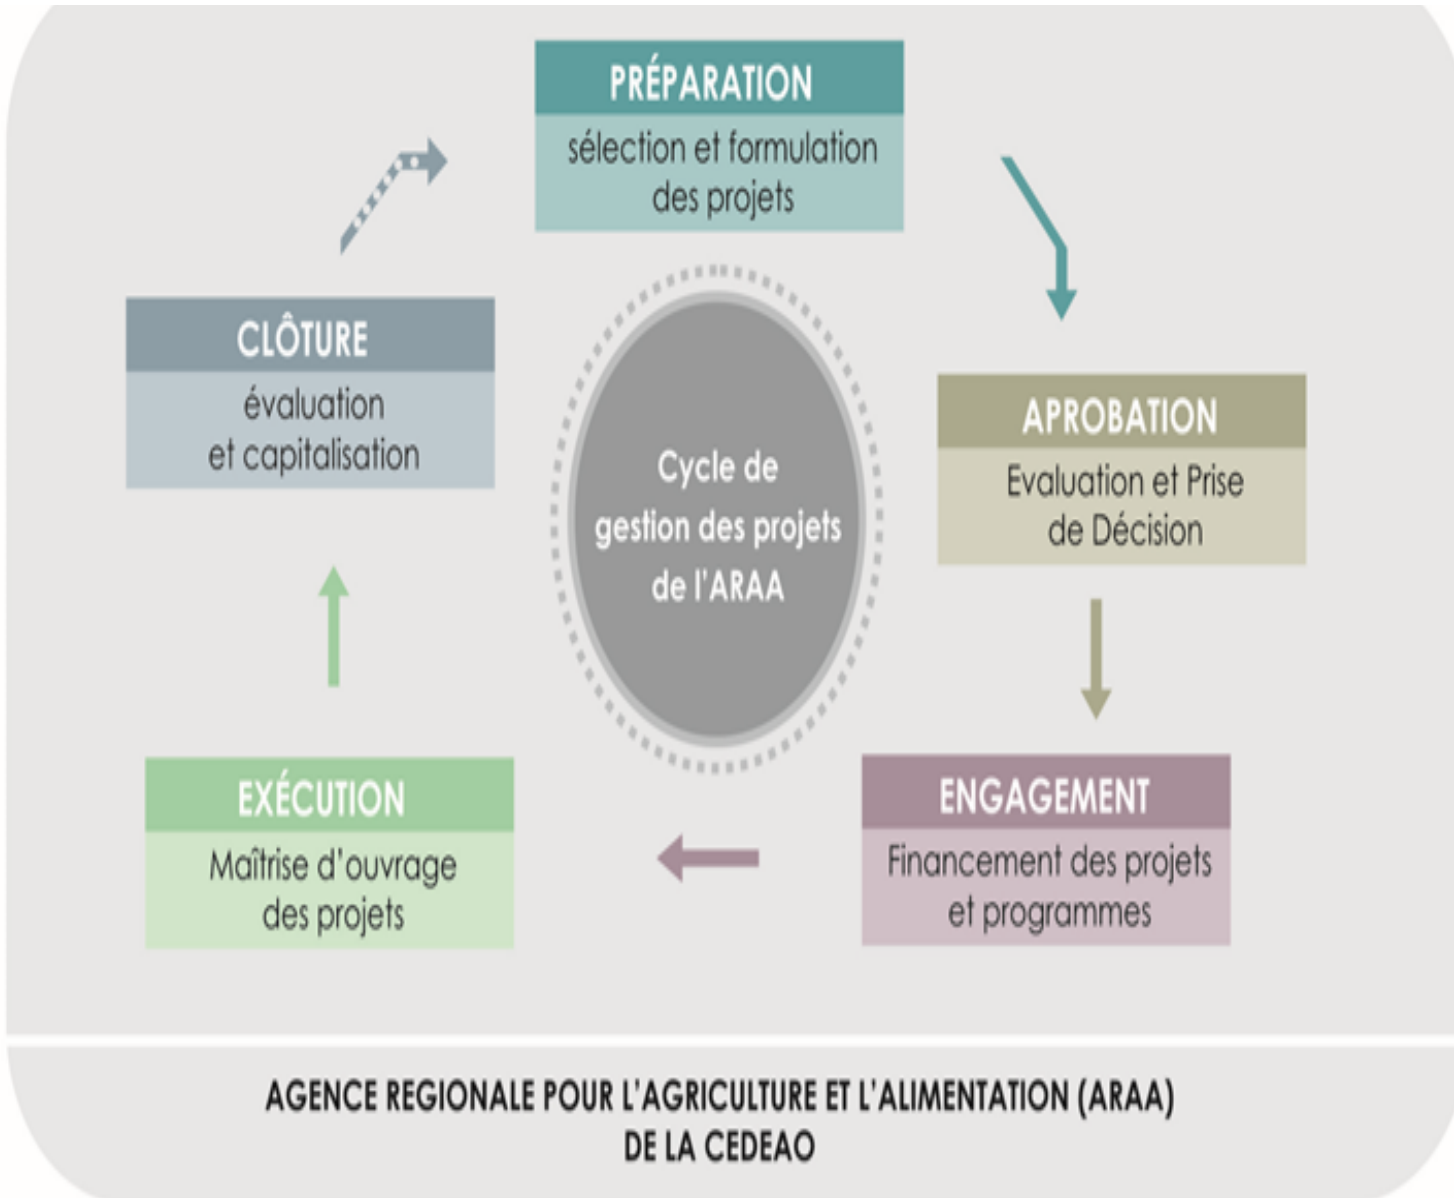


2. Approbation (Instruction):

Appréciation détaillée des aspects liés à l'adéquation des résultats attendus aux besoins des bénéficiaires directs, indirects et finaux, aux objectifs, aux modalités de mise en œuvre, à l'approche de gestion du projet proposée, aux effets et impacts attendus, etc.

- Décision si oui ou non préparer une proposition de financement
- Préparation du projet de proposition de financement

Le Cycle de Project de l'ARAA

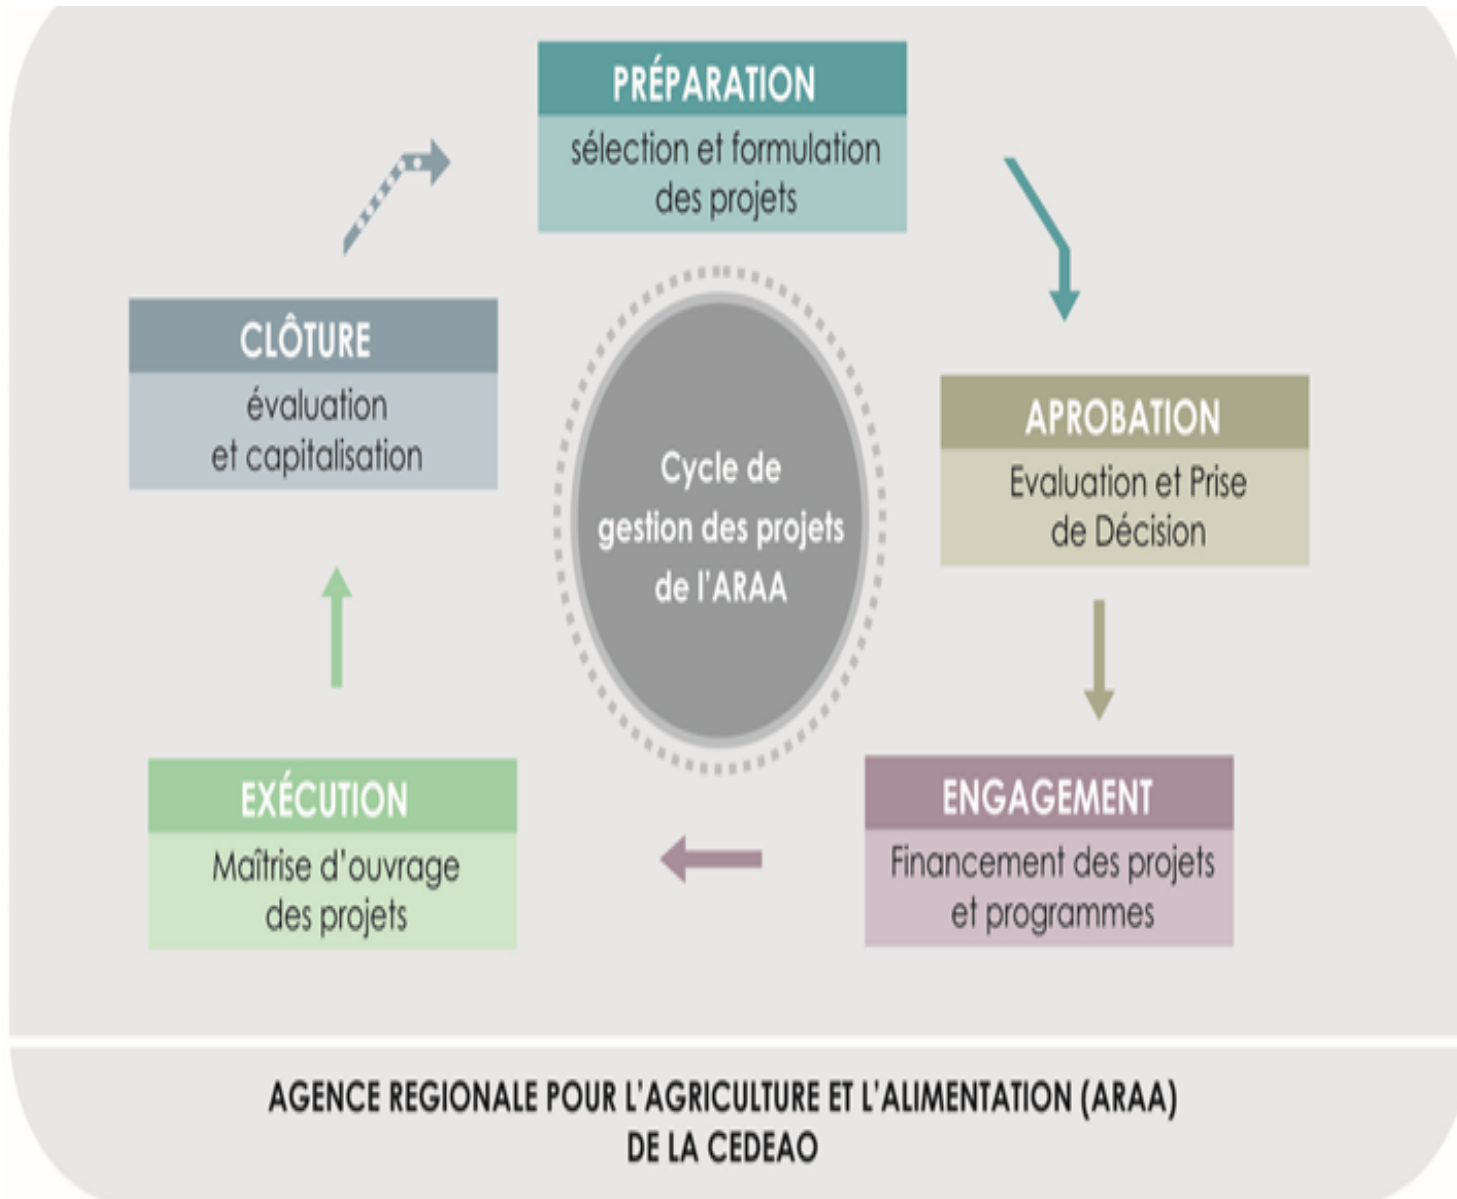


3. Engagement (Financement):

Décision d'affecter des moyens (financiers et humains) de l'ARAA à un projet, convention fixant les objectifs à atteindre, les moyens envisagés et les obligations:

1. Préparation des contrats et des services juridiques de la CEDEAO
2. Signature et enregistrement dans le système comptable et le système informatisé
3. Notification et octroi de financement
4. Déblocage des premières tranches


Le Cycle des Projects de l'ARAA

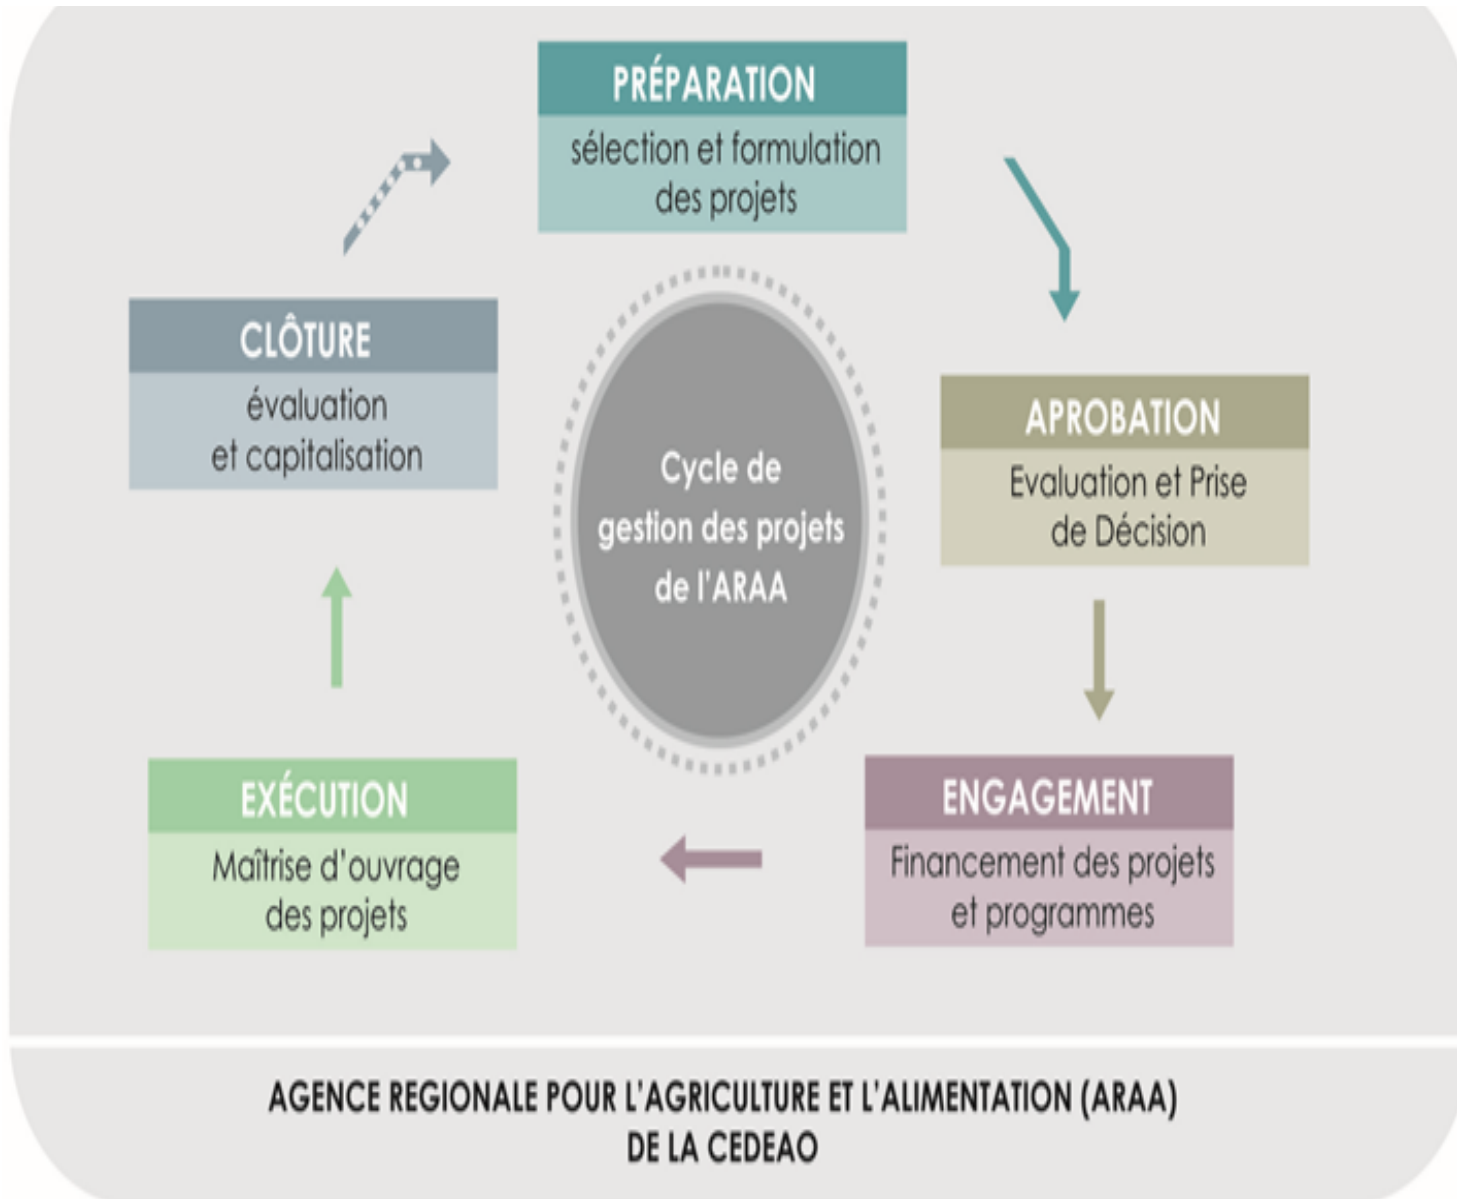

4. Execution (Mise en œuvre): Réalisation concrètes des activités:

1. Evaluation préliminaire mise en contact avec les porteurs de projets
2. Supervision régulière par période (trimestre, semestre)

Le Cycle de Project de l'ARAA

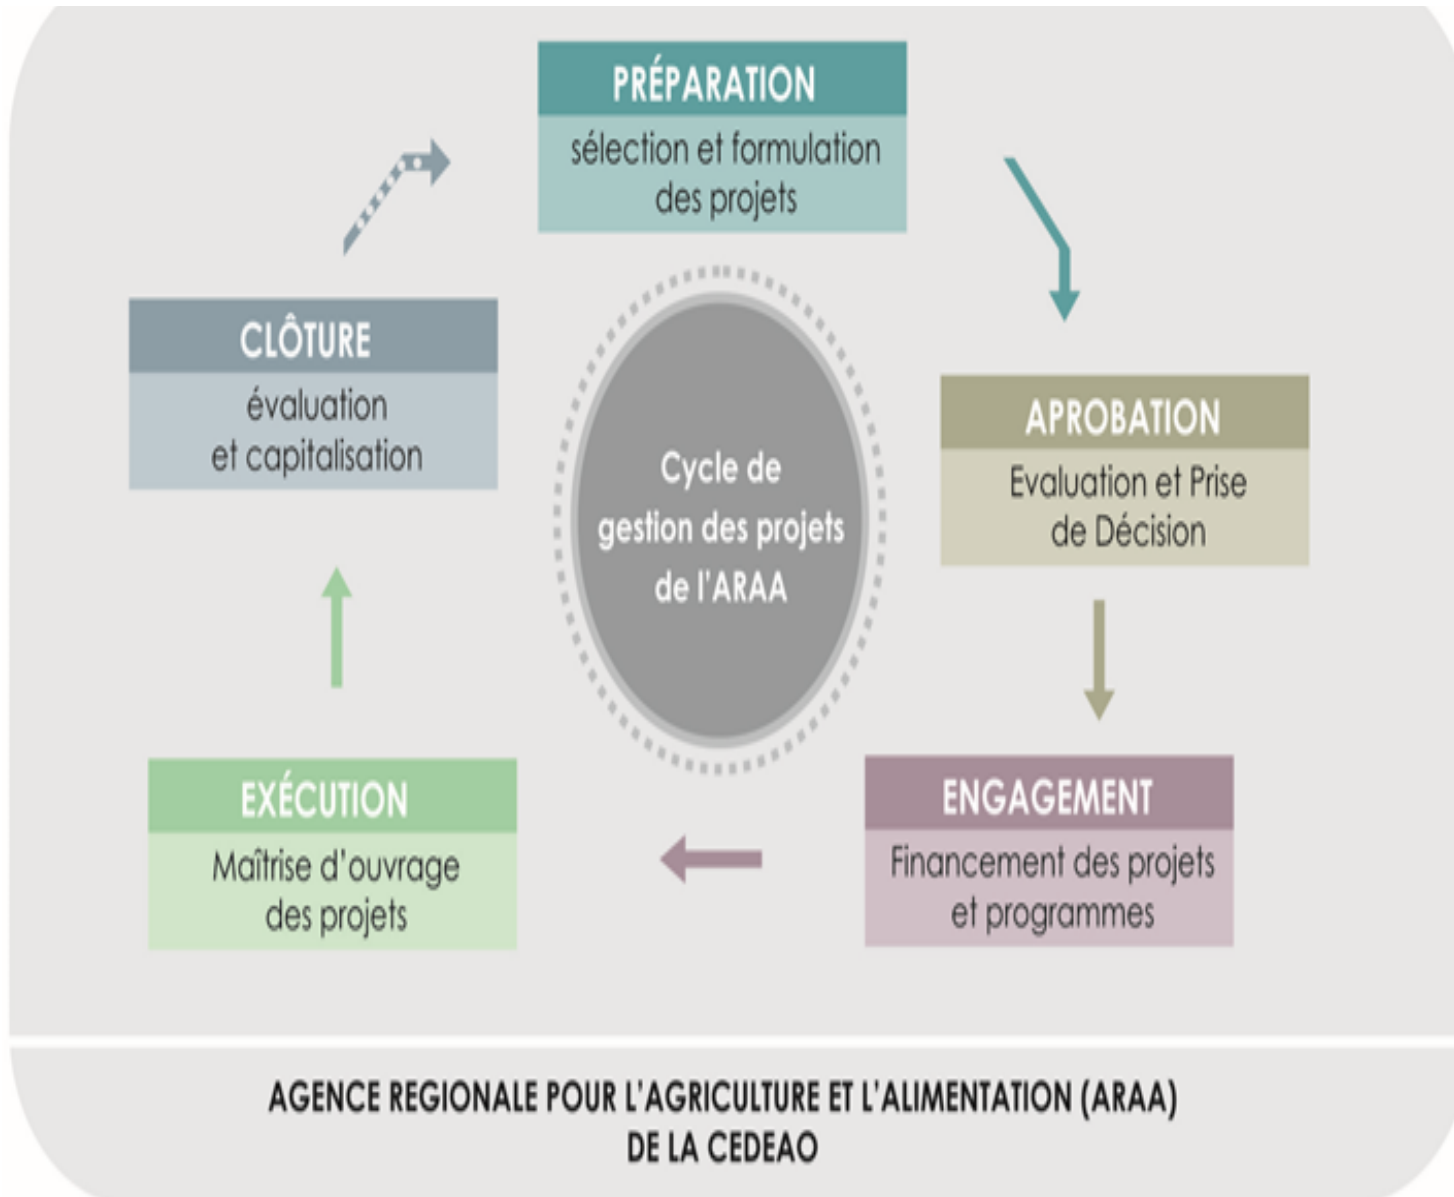

5 Cloture (Evaluation):
Réception / inauguration /
transfert

Evaluation finale

Capitalisation

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

—

MERCI DE VOTRE ATTENTION

—

OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO



MANUEL
DE GESTION
DU CYCLE DES PROJETS

